

DATE DISPO

15/09/2025

19/09/2025

Effacer filtres

TYPE LOT

G

M

P

STATUT FAB LOT

En cours

Terminé

STATUT DELAI LOT

Lot dans délai

Lot en retard

14


Lots Hors Délai

143

Lots Sélectionnés

982

Qté PLENUM

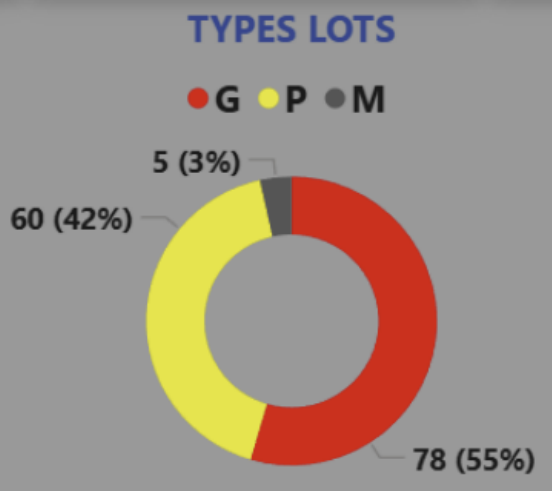


Ecart Planning Fab

1

Délai Atelier

5

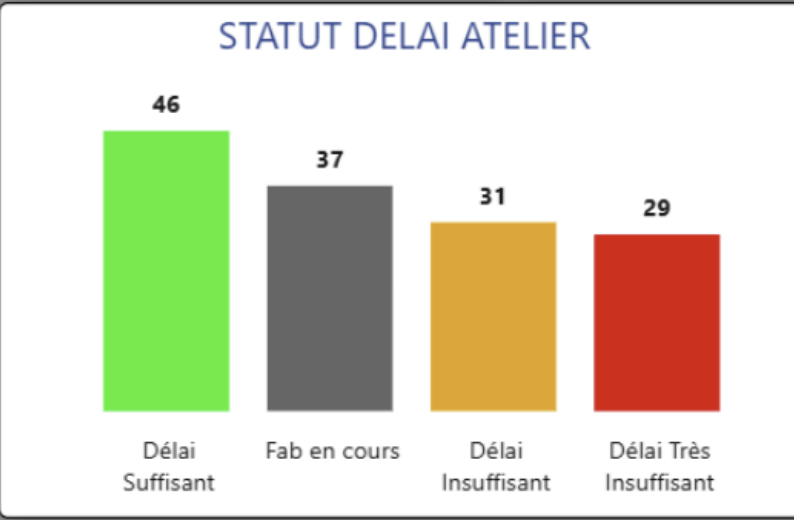

DETAIL LOTS


ID	TYPE	CLIENT	CHANTIER	CONTENU	DEMANDEUR	DATE DISPO	DATE TERMINE	STATUT PLANNING FAB	ECART PLANNING FAB	STATUT DELAI ATELIER	ECART DELAI ATELIER
20537	P			L6	JEROME B	lundi 15 septembre 2025		Fab en cours en retard	-3	Fab en cours	
20538	P			M5	JEROME B	lundi 15 septembre 2025		Fab en cours en retard	-3	Fab en cours	
20595	P			L5	JEROME B	lundi 15 septembre 2025		Fab en cours en retard	-3	Fab en cours	
20596	P			M6	JEROME B	lundi 15 septembre 2025		Fab en cours en retard	-3	Fab en cours	
20624	P			M4	JEROME B	lundi 15 septembre 2025		Fab en cours en retard	-3	Fab en cours	
20625	P			S5	JEROME B	lundi 15 septembre 2025		Fab en cours en retard	-3	Fab en cours	

Effacer filtres

DETAIL LOT

ID	CLIENT	CHANTIER	CONTENU	DEMANDEUR	QTE PLEI
20537			L6	JEROME B	64
20538			M5	JEROME B	52
20595			L5	JEROME B	32
20596			M6	JEROME B	40
Total					

TOLE GALVA (kg)

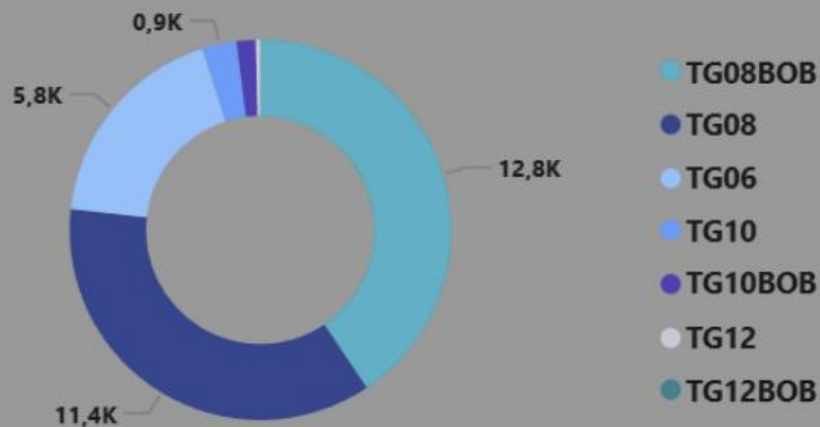


DETAIL FAMILLE ELEMENT

Famille Element	Qté	Prix Déboursé	Prix Revient
<b>TOLE GALVA</b>	<b>31 605</b>	<b>29 076</b>	<b>39 253 €</b>
TG08BOB	12 811	11 658	15 738 €
TG08	11 425	10 511	14 190 €
TG06	5 788	5 439	7 343 €
TG10	916	861	1 162 €
TG10BOB	513	462	623 €
TG12	120	114	154 €
TG20	33	31	42 €
TG12BOB	0	0	0 €
<b>TEMPS</b>	<b>866</b>	<b>14 529</b>	<b>19 614 €</b>
MO	743	12 458	16 818 €
MOISO	123	2 071	2 796 €
<b>ISOLANT</b>	<b>1 564</b>	<b>9 975</b>	<b>13 466 €</b>
ISO	723	6 471	8 736 €
MOUSSE	784	2 776	3 748 €
ISO40	57	727	982 €
<b>CADRES &amp; EQUERRES</b>	<b>10 777</b>	<b>4 725</b>	<b>6 379 €</b>
Z30	1 784	1 249	1 686 €
Z20	2 524	909	1 227 €
EM3	1 608	900	1 216 €
PP	805	644	869 €
GP	341	358	483 €
EM2	1 476	354	478 €
<b>Total</b>	<b>45 170</b>	<b>58 840</b>	<b>79 434 €</b>


ISOLANT (m<sup>2</sup>)

MOUSSE ISO ISO40

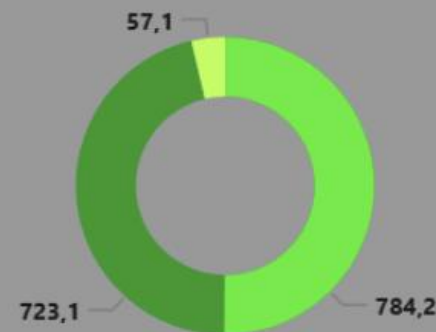

TEMPS (en h.)

MO MOISO

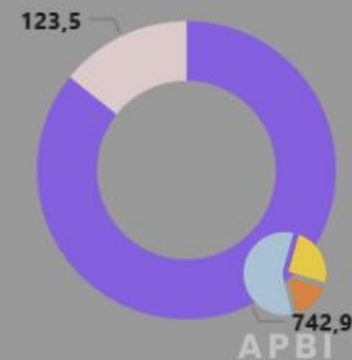

06/01/2025

18/09/2025

Effacer filtres

G

M

P


Stock à  
surveiller

Stock alerte

Stock récent

Tout

## NB LOTS PAR STATUTS

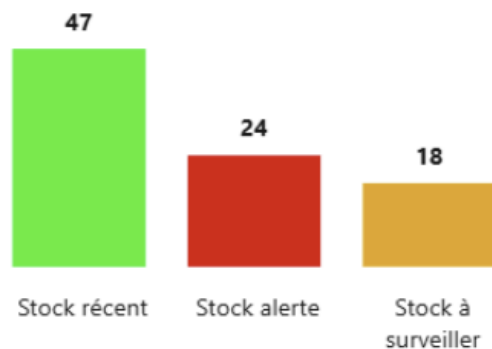


89

Lots en stock

20

Jours Stockage Moyen

## TYPE LOTS EN STOCK

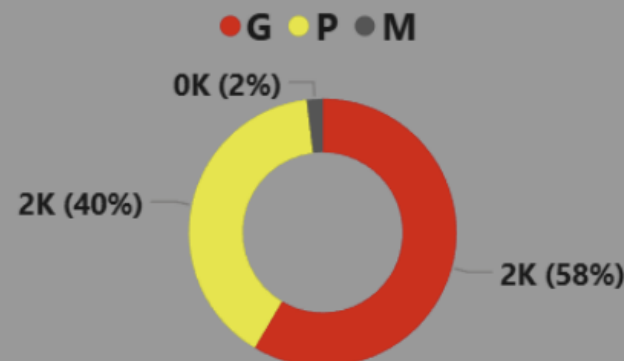

## NB LOTS PAR CLIENTS

CLIENT #

#

6

6

6

5

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1



APBI

Total

De vos données à vos décisions

## DETAIL LOTS EN STOCK (jours ouvrés)

ID	TYPE	CLIENT	CHANTIER	CONTENU	ZONESTOCK	DATE TERMINE	DEMANDEUR	NB JOURS	STATUT STOCKAGE
16932	G			1	P1	lundi 6 janvier 2025	ALINE	183	Stock alerte
17600	G			REP 1	4	jeudi 13 février 2025	JAMILA	155	Stock alerte
17738	P			11	4	mardi 18 février 2025	JEROME G	152	Stock alerte
18503	G			1-3	P1	lundi 7 avril 2025	VINCENT	119	Stock alerte
18892	P			1	4	mardi 13 mai 2025	CRISTIAN	93	Stock alerte
19452	G			1-3	RACK	mercredi 11 juin 2025	ALINE	72	Stock alerte
19561	G			1-9	P12	lundi 23 juin 2025	JEROME B	64	Stock alerte
19754	G			1-4	P13	vendredi 27 juin 2025	JEROME B	60	Stock alerte
19771	G			1-14	P-TUBES	mardi 1 juillet 2025	FLORENT	58	Stock alerte
19699	P			1-2	4	mercredi 2 juillet 2025	CRISTIAN	57	Stock alerte

Effacer filtres

17

Lots

GAINE

2711

Poids TOLE GALVA

PLENUM

19

Lots

615

Qté PLENUM

4080


Poids TOLE GALVA

GAINE

ID	TYPE	CLIENT	CHANTIER	CONTENU	DEMANDEUR	DATE DISPO	# ETAPES A REALISER	# ETAPES REALISEES	% AVANCEMENT
20534	G			REP 18 CT40+ISO25+Z	TOM	jeudi 21 août 2025	7	6	86 %
20906	G			1-14	JEROME B	mercredi 17 septembre 2025	8	7	88 %
20908	G			1-5	DIDIER	jeudi 18 septembre 2025	8	6	75 %
20914	G			1-14	JEROME B	jeudi 18 septembre 2025	8	6	75 %
20921	G			1	VINCENT	jeudi 18 septembre 2025	4	4	100 %
20923	G			1-4	JEROME B	jeudi 18 septembre 2025	7	5	71 %
20925	G			1-9	JEROME B	jeudi 18 septembre 2025	6	5	83 %
20927	G			1-6	VINCENT	jeudi 18 septembre 2025	6	5	83 %
20951	G			2-3	DIDIER	jeudi 18 septembre 2025	4	4	100 %

PLENUM

ID	TYPE	CLIENT	CHANTIER	CONTENU	DEMANDEUR	DATE DISPO	# ETAPES A REALISER	# ETAPES REALISEES	% AVANCEMENT
20537	P			L6	JEROME B	lundi 15 septembre 2025	6	5	83 %
20538	P			M5	JEROME B	lundi 15 septembre 2025	6	5	83 %
20595	P			L5	JEROME B	lundi 15 septembre 2025	6	5	83 %
20596	P			M6	JEROME B	lundi 15 septembre 2025	6	4	67 %
20624	P			M4	JEROME B	lundi 15 septembre 2025	6	5	
20625	P			S5	JEROME B	lundi 15 septembre 2025	6	5	



APBI

De vos données à vos décisions

# CHARGE ATELIER

## GAINE

507,00

Capacité Production

54,25

Charge en cours

452,75

Delta Capacité / Charge

## GAINE

ID	TYPE	STATUT LOT	CLIENT	CHANTIER	CONTENU	DEMANDEUR	DATE DISPO	MO	TAUX AVANCEMENT	CHARGE EN COURS
20921	G	En cours			1	VINCENT	jeudi 18 septembre 2025	0,00	100,00 %	0,0
20951	G	En cours			2-3	DIDIER	jeudi 18 septembre 2025	1,77	100,00 %	0,0
20906	G	En cours			1-14	JEROME B	mercredi 17 septembre 2025	8,84	88,00 %	1,0
20912	G	En cours			1-10	VINCENT	vendredi 19 septembre 2025	5,26	86,00 %	0,7
20925	G	En cours			1-9	JEROME B	jeudi 18 septembre 2025	6,14	83,00 %	1,0
20927	G	En cours			1-6	VINCENT	jeudi 18 septembre 2025	4,67	83,00 %	0,7
Total								72,51		16,9

## PLENUM

(Vide)

Capacité Production

(Vide)

Charge en cours

(Vide)

Delta Capacité / Charge

## PLENUM

ID	TYPE	STATUT LOT	CLIENT	CHANTIER	CONTENU	DEMANDEUR	DATE DISPO	MO	TAUX AVANCEMENT	CHARGE EN COURS
20537	P	En cours			L6	JEROME B	lundi 15 septembre 2025	0,00	83 %	
20538	P	En cours			M5	JEROME B	lundi 15 septembre 2025	0,00	83 %	
20595	P	En cours			L5	JEROME B	lundi 15 septembre 2025	0,00	83 %	
20596	P	En cours			M6	JEROME B	lundi 15 septembre 2025	0,00	67 %	
Total								76,62		



# COURBE CHARGE ATELIER GAINE

## GAINE

Capacité Production Charge en cours MO Capacité +10% Capacité -10%

